




Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvænget 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com




Civilsamfundspuljeprojektet

Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu

Projektdetaljer

- Startdato: 1. januar 2018
- Slutdato: 31. december 2019
- Totalbudget: 414.719 kr.
- Bevilling fra Civilsamfundspuljen: 399.999 kr.
- Egenfinansiering MBHU: 14.720 kr.
- Indsatsområde: Kanungu Town Council
- Målgruppe: 500 sårbare husstande med 500 forsørgere og 1500 OVC'er samt over 3000 borgere og lokale ledere i 30 landsbyer (22 gamle + 8 nye).
- Nye aspekter: Landbrugsforbedring, juridisk rådgivning og vold mod kvinder og børn (GBV).



Styregruppe og projektteam

Styregruppe Uganda: **Project implementation team**


- Alex Orikushaba, executive director MBHU, 40%
- Rogers Ampumuza, project manager, 100%
- Sarah Nimbisiima, SLEP project officer, 100%
- Proscovia Mucunguzi, advocacy proj. officer, 50%
- Gerald Tweyongyere, regnskabsansvarlig, 100%
- Stephen Tumwebaze

Styregruppe Danmark:

- Mikkel Juul Larsen, projektansvarlig
- Rune Møller Paulsen, regnskabsansvarlig
- Anne-Lise Skou
- Casper F. Nørgaard


Kommunikation:

- Månedsrappporter til os
- Kvartalsfeedback fra os
- Fysiske møder og tilsyn januar 2019
- E-mail ad hoc




Projektmål

- Overordnet mål: At gøre sårbare husstande i stand til at blive selvforsørgende og at opbygge en bevidst og aktivt involveret befolkning i Kanungu Town Council.
- Konkret projektmål nr. 1: Ved afslutningen af det toårige projekt er 500 sårbare husstande i 30 landsbyer organiseret i bæredygtige selvhjælpsgrupper og har tilegnet sig bedre landbrugsmetoder og økonomisk forvaltning resulterende i forbedret fødevarerproduktion og forøget indkomst, der er tilstrækkelig til en anstændig levestandard for alle børn og voksne i husstanden.



Projekt mål

- Konkret projekt mål nr. 2: Ved afslutningen af det toårige projekt er mindst 3000 borgere og lokale ledere bevidste om menneskerettigheder og emner såsom kønsbaseret vold og er i stand til at rapportere og henvise sager om rettighedsbrud, skaffe sig retshjælp og holde ledere ansvarlige.




Status pr. 31. maj 2019

1.1 Introduktion af projektet for interessenter (M1 = måned 1):

- Møde med deltagelse af 48 interessenter afholdt i byrådssalen i Kanungu 29/1 2018 (M1). *Aktivitet afsluttet.*

1.2 Oplæring af frivillige (CBT'er) som forkæmpere inden for kønsbaseret vold og menneskerettighedskoncepter (M1-M3):

- Oplæringsforløb for projektets seks frivillige med særlig fokus på menneskerettigheder, kønsbaseret vold og fortalervirksomhed gennemført 30-31/1 2018 (M1). *Afsluttet.*




Status pr. 31. maj 2019

1.3 Analysering af landsbyer i Kanungu Town Council (M1-M5):

- Projektintroduktion, oplysning, behovsanalyse og identifikation og udvælgelse af sårbare husstande foretaget i indsatsområdets 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). I alt 1421 borgere deltog. *Afsluttet.*

1.4 Mobilisering af sårbare husstande i 30 landsbyer (M1-M8):


- Mobilisering af de udvalgte sårbare husstande udført i de 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). Herefter er mobilisering til deltagelse i møder og oplæring fortsat i juni-august 2018 (M6-M8). *Afsluttet.*



Status pr. 31. maj 2019

1.5 Dannelse og styrkelse af selvhjælpsgrupper (SHG'er) og sammenslutninger (CLA'er) og oplæring i spare-låne-koncept (M4-M20):

- Dannelse og indledende oplæring af grupper udført i de 30 landsbyer i maj-oktober 2018 (M5-M10). Styrkelse og yderligere oplæring foretaget i 22 grupper i juli 2018-marts 2019 (M7-M15). Sammenbinding af grupperne i fem sammenslutninger (gensidig læring, stærkt netværk, kraftfuld stemme) foretaget og sammenslutningerne styrket i december 2018-maj 2019 (M12-M17).



Status pr. 31. maj 2019


1.6 Udførelse af deltagerinddragende identifikation og udvælgelse af gruppeprojekter at støtte i SHG'erne (M6-M14):

- Identifikation og udvælgelse af fælles projekter foretaget af de deltagende husstande i hver landsbys gruppe i de 30 landsbyer i juni 2018-februar 2019 (M6-M14). Diverse supplerende besøg foretaget i et antal landsbyer i november 2018-februar 2019 (M11-M14). *Afsluttet.*

1.7 Forsyning med materialer og faglig assistance til de udvalgte gruppeprojekter (M7-M18):

Startkapital (ca. 925 kr.) og rådgivning ydet til 29 grupper i juli 2018-maj 2019 (M7-M17).


Produktion af mursten til fremstilling af nyudviklede kogesteder mhp. uddeling til 300 husstande påbegyndt i april 2019 (M16).



Status pr. 31. maj 2019

1.8 Oplæring af SHG'er i bedre landbrugsmetoder (M7-M18):

- Oplæring i bedre landbrugsmetoder tilrettelagt ved møder mv. i juni 2018 (M6) og udført af kommunal ressourceperson i 15 grupper i juli 2018-marts 2019 (M7-M15). Opfølgning foretaget i fem grupper i oktober-december 2018 (M10-M12), bl.a. ved udvekslingsbesøg. 25 husstandslandbrug og et antal fælleshaver i 11 landsbyer besøgt sammen med delegation fra dansk partner 9-14/1 2019 (M13). Studietur for otte lokale personer til Farming 4 Lifes demonstrationslandbrug i Lira gennemført 2-4/1 2019 (M13). Demonstrationslandbrug inspireret af studieturen planlagt i marts 2019 (M15) og påbegyndt etableret (to stk.) i april-maj 2019 (M16-M17)).



Status pr. 31. maj 2019

1.9 Opfølgning og ydelse af rådgivning til SHG'er og udarbejdelse af handlingsplaner af lokalbefolkningen (M5-M20):


- Opfølgningsbesøg foretaget i de fleste af de 30 grupper og diverse handlingsplaner udarbejdet i juli 2018-april 2019 (M7-M16). Samarbejde med de kommunale skolemyndigheder indledt i august 2018 (M8), to skoler med forældreløse og udsatte børn besøgt i september 2018 (M9), stor dialogseance om sundhed arrangeret sammen med distriktsmyndighederne og en anden organisation i september 2018 (M9), dialogmøde med nøglepersoner fra lokale myndigheder og organisationer afholdt i oktober 2018 (M10) og møder angående to skoler med kritisable forhold afholdt i marts og maj 2019 (M15 og M17) som opfølgning på handlingsplaner.



Status pr. 31. maj 2019

2.1 Bevidstgørelsesmøder på landsbyniveau for at gøre borgerne i stand til at identificere, prioritere og udarbejde handlingsplaner rettet mod menneskerettighedsovertrædelser og andre servicesvigt (M4-M20):


- En halv snes interaktive bevidstgørelsesmøder med gennemsnitlig deltagelse af cirka 100 borgere fra tre landsbyer afholdt i april 2018-april 2019 (M4-M16). Menneskerettigheder formidlet til 664 personer ved dialogseancer forestået af dansk partner i seks landsbyer 10-14/1 2019 (M13). Menneskerettighedsformidlingen fortsat ved seancer med 89 personer i februar 2019 (M14) og med 85 personer i maj 2019 (M17).



Status pr. 31. maj 2019

2.2 Ydelse af gratis retsoplæring i lokalsamfundene og identifikation af sager til forelægning for instanser, der yder gratis retshjælp (M4-M20):


- En række offentlige såvel som gruppespecifikke oplærings- og dialogseancer om retsforhold samt et kursus for lokale ledere afviklet med hjælp fra lokale ressourcepersoner i april 2018-maj 2019 (M4-M17). Rådgivning og henvisning til instanser, der kan hjælpe, ydet som opfølgning på seancerne i et antal konkrete sager.



Status pr. 31. maj 2019

2.3 Dannelse af OVC-koordineringskomite i Kanungu Town Council (M2-M21):

- En komite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns (OVC'ers) tarv dannet med 12 relevante og indflydelsesrige personer i februar 2018 (M2). Halvdagsmøder i komiteen afholdt i juli 2018 (M7), 29/11 2018 (M11), i februar 2019 (M14) og i maj 2019 (M17) med konkrete og generelle sager på dagsordenen og handlingsplaner til følge.




Status pr. 31. maj 2019

2.4 Kvartalsvis afholdelse af engageringsworkshops for ansvarshavere på distriktsniveau (M3-M24):

- Møde med deltagelse af 33 interessenter afholdt 29/3 2018 (M3), med 30 interessenter 28/6 2018 (M6), med 75 interessenter i september 2018 (M9), med 29 interessenter i december 2018 (M12) og i april 2019 (M16).

2.5 Gennemførelse af radioudsendelser om menneskerettigheder, kønsbaseret vold og retsspørgsmål (M2-M24):

- Seks radioprogrammer med fokus på projektet, rettigheder, kønsbaseret vold, servicesvigt og sygdomsbekæmpelse optaget og sendt i Kanungu FM og Kanungu Broadcasting Services i februar 2018-april 2019 (M2-M16).



Status pr. 31. maj 2019

3.1 Baggrundsundersøgelse (M1-M3):

- Undersøgelse af forholdene i indsatsområdet før projektimplementeringen udført af ekstern konsulent i februar 2018 (M2). Rapport modtaget 4/5 2018. *Afsluttet.*

3.2 Månedlige planlægnings- og opsamlingsmøder (M1-M24):


- Internt møde for projektets ansatte og frivillige afholdt i hver måned fra januar 2018 til maj 2019 (M1-M17).

3.3 Kvartalsvise opsamlingsmøder (M3-M24):

- Møder med deltagelse af MBHU's bestyrelse, ledelse, projektledelse og eksterne interessenter afholdt hvert kvartal (M3-M16).

3.4 Rutineopfølgningsbesøg (M4-M23):

- Besøg for at følge op på deltagelsen og konkrete sager udført jævnligt af projektimplementeringsholdet i alle grupper mv. (M4-M17).



8.-15. januar 2019

UGANDA
EQUATOR




MEND THE BROKEN HEARTS UGANDA

BWAGI & CO. ADVOCATES
P.O BOX 270 RUKUNGIRI
TEL 0782 722888
0788 537066
KANUNGU BRANCH



CIVILSAMFUND I UDVKLING
Website : www.mbhu.org

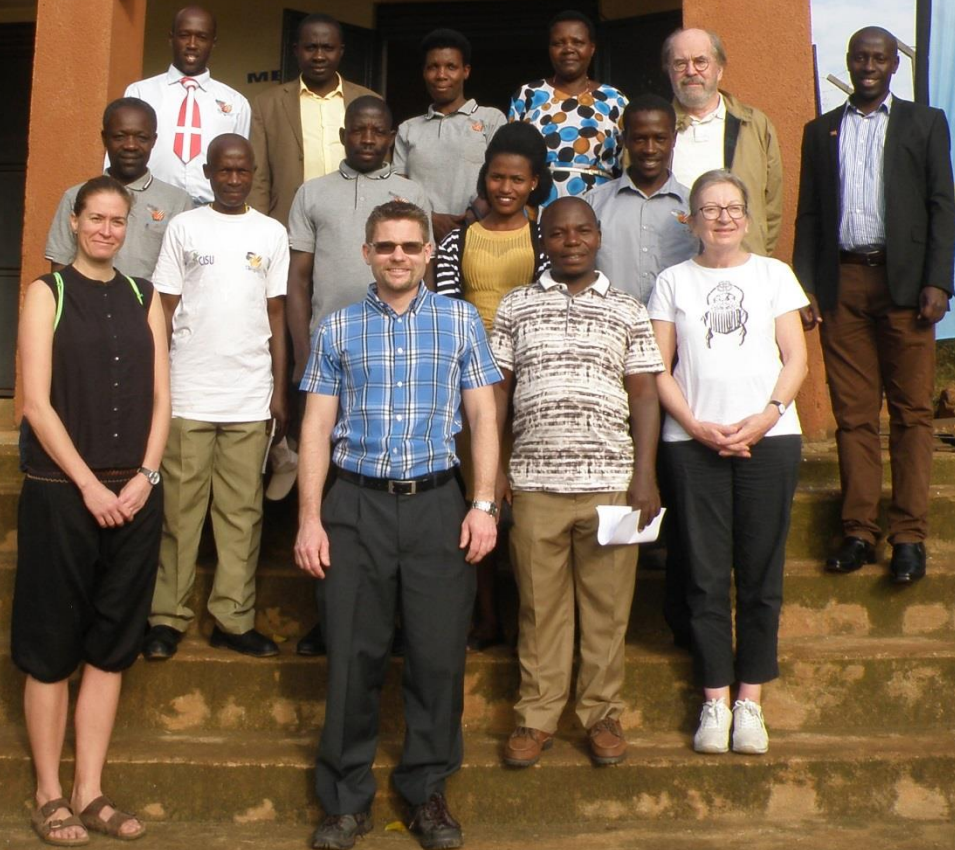






































Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

v/ formand Mikkel Juul Larsen

Erholmvangenget 46, 5230 Odense M

selvhjaelp.uganda@gmail.com



Tusind tak for opmærksomheden!

Spørgsmål besvares gerne 😊
